
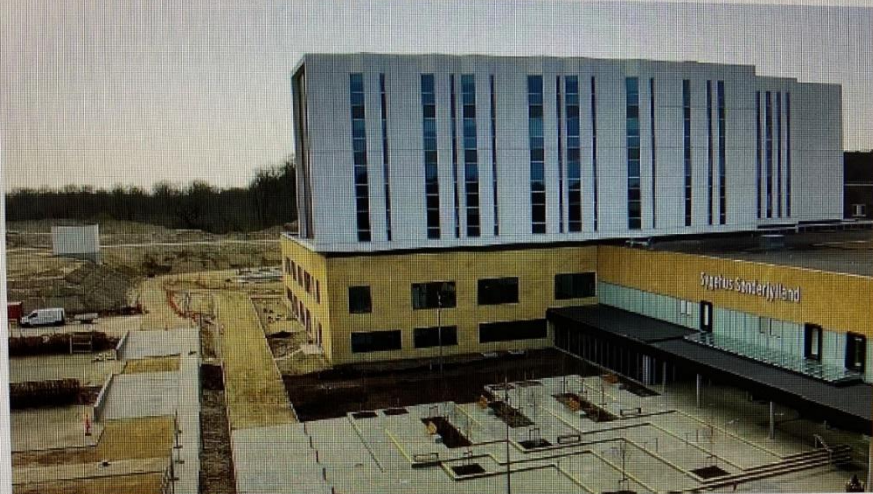


Rapportering nr. 38 for  
kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa





Øverst: Den nye forplads ved Indgang A.  
Nederst: Anlægsarbejderne skrider frem.



# Opmærksomhedspunkter

- generelt om projektet

- Økonomi (fase 2)

Samlet set er økonomien fortsat indenfor budget, dog er der følgende risici:

- Udfordret pga. adskillige uforudsete omkostninger i 2019 samt ikke mindst slutopgørelse af hovedtilbuddet.
- Slutopgørelsen af hovedtilbuddet ansues som en risici af revisionen.
- Entreprenør har løbende i projektet fremført en række krav som bygherre løbende har afvist. Disse krav er imidlertid fastholdt på slutopgørelsen og skal håndteres nu.

Samtidig viser den seneste beregning af likvide reserver efter at risici er dækket yderligere ind, at der skulle være tilstrækkelig reserver til at dække det mindre ombygningsprojekt ind.

- Tid

- Fortsat markeret i grøn – dog har bygningsarbejderne været præget af restriktionerne som følge af covid-19.
- Der udestår afklaring af konsekvenserne af covid-19 situationen.
