



Region Syddanmark

idéoplæg

Justering af forpladsen på Kolding Sygehus

Senest ajourført den 7. oktober 2020

IDÉOPLÆG

Etablering af Forplads ved Kolding Sygehus

1. STAMOPLYSNINGER

- Justering af forpladsen på Kolding Sygehus
- Adresse: Sygehusvej 24, 6000 Kolding

2. GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE

I forbindelse med byggeriet af Nyt Kolding Sygehus og etableringen af forpladsen lagde man stor vægt på at sikre et roligt og overskueligt udtryk på forpladsen. Dette for at gøre det nemt for patienter og pårørende at danne sig et overblik i forbindelse med såvel ankomst som afgang fra sygehuset hovedindgang og indgangen til Akutafdelingen. Forpladsen fremstår derfor i dag uden forstyrrende elementer hvilket giver mulighed for hurtigt at orientere sig og få overblik over adgangsforholdene.

De seneste års erfaring har dog vist, at stigningen/hældningen på forpladsen kan være svær at forcere for gangbesværede og kørestolsbrugere. På den baggrund har Sygehus Lillebælt arbejdet med flere forskellige løsningsforslag for at forbedre adgangsforholdene for handicappede og gangbesværede. Fokus i arbejdet har været at sikre en niveaufri adgang til hovedindgangen og akutmodtagelsen. Derudover har forhold som patientsikkerhed, anlægsmæssige forhold og parkeringsforhold haft en afgørende betydning i forhold til at vurdere de forskellige løsningsforslag.

Projektets formål er dermed at skabe bedre tilgængelighed til hovedindgangen og indgangen til Akutafdelingen på Kolding Sygehus.

I processen frem imod udvælgelse af en løsning har driften, handicaporganisationer samt Anlæg- og innovationsudvalget været involveret.


Helt konkret er der i løbet af 2020 indhentet forslag til indretning og justering af forpladsen fra 3 forskellige anlægsarkitekter. De forskellige forslag er vurderet først af driftsorganisationen med henblik på at vurdere gennemførligheden, implikationer for driften samt sammenhængen til den eksisterende bygningsmasse. Forslagene er derefter sendt i høring hos udvalgte handicaporganisationer. Såvel driftsorganisationen og handicaporganisationernes kommentarer og anbefalinger er viderebragt til Anlægs- og innovationsudvalget med henblik på en beslutning om videre forløb. Denne proces er resulteret i, at der nu, på baggrund af Anlægs- og innovationsudvalgets beslutning, arbejdes videre med en konkret retning for justeringen. Den valgte retning er i tråd med dels handicaporganisationernes, dels Sygehus Lillebælts anbefaling.

3. FUNKTIONSBESKRIVELSE

Der arbejdes nu videre med ét konkret forslag. Her bevares den eksisterende forplads, og det større græsareal til højre for forpladsen inddrages til et større område med parkeringspladser til handicappede. Samtidig etableres der en elevator fra parkeringspladserne til forpladsen for at skabe en let og tilgængelig niveauneutral adgang til hovedindgangen og akutmodtagelsen. Der etableres samtidig en asfalteret indkørsel til indgang 22, hvilket betyder at liggende transportere kan køre til indgang 22 og afsætte patienter. Dette vil reducere trafikken på den anden side af indgang 22, da denne side af indgangen på nuværende tidspunkt ligger i forlængelse af et vejsving, hvilket til tider skaber farlige trafiksituationer. Ud over adgang for liggende transportere vil gående patienter også få en let og tilgængelig adgang til blandt andet korttidskirurgiskafsnit fra det nye parkeringsområde.

- Adgangsvejen fra parkeret bil til elevator og fra elevator til indgang bliver niveaufrie uden større højdeforskel der skal overvindes.
- Mulighed for parkering og afsætning tæt på ambulante funktioner
- Mulighed for at udvide antallet af P-pladser for handicappede og etablering af ordinære P-pladser.
- Mulighed for at skabe nye forbindelsesmuligheder og adgange til andre afdelinger.
- Alle handicapparkeringspladser vil holde på et fladt areal.
- Etablering kan ske uden større gener for adgangsvejene mod hovedindgangen.
- Bedre muligheden for at begrænse/ afskærme i forhold til jord og støv.
- Forpladsen vil i højere grad kunne benyttes i anlægsperioden.
- Der skabes mere plads for udendørs ophold i form af en række cirkulære pladser
- De nye cirkulære pladser danner endnu en adgangsvej mod hovedindgangen.

Illustration løsning:

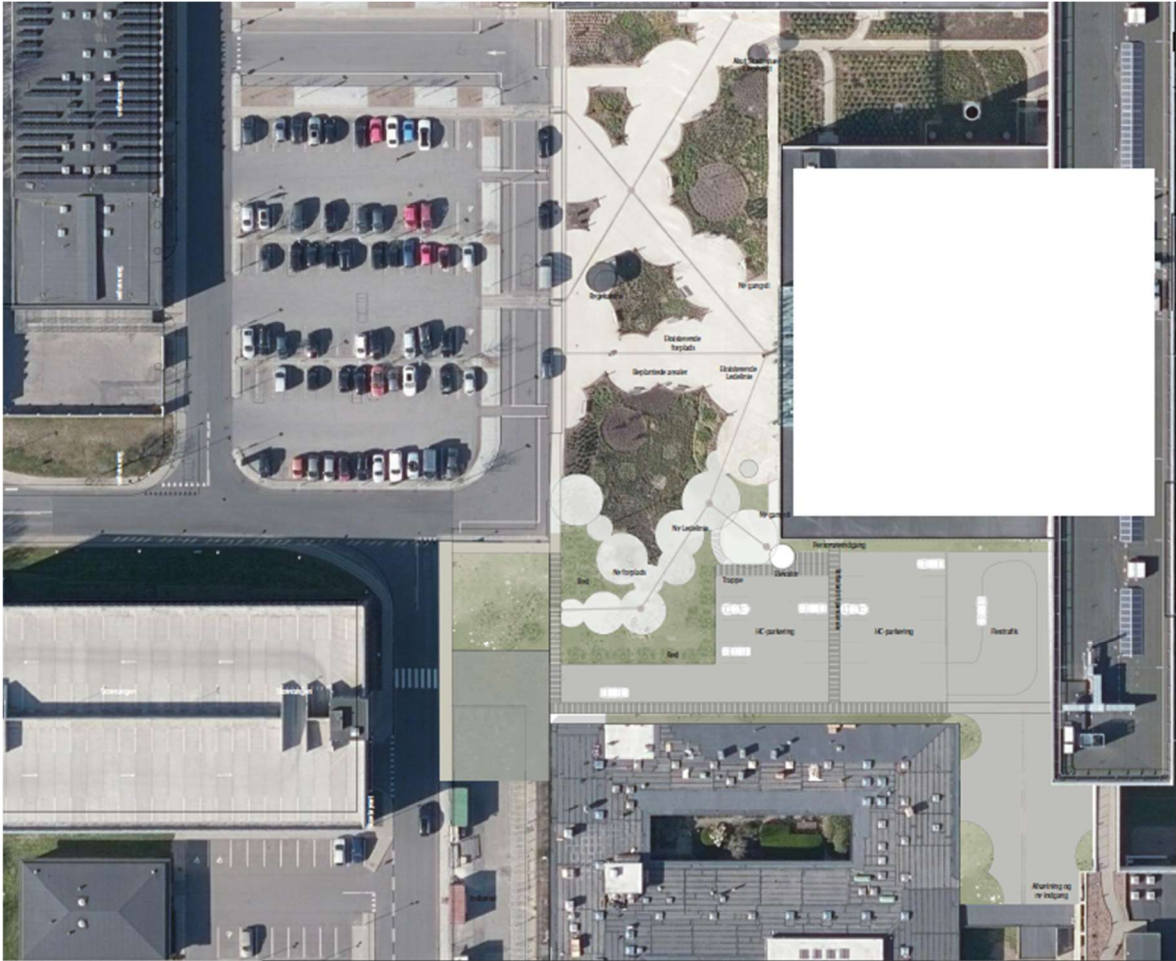

4. LOKALISERING

Se venligst ovenstående tegning for illustration om projektets areal.

5. TIDSPERSPEKTIV

Nedenstående hovedtidsplan for projektet:

Projektering af rådgivere:	uge 41-48 2020
Udbudsperiode:	uge 49-51 2020
Kontraktindgåelse med entreprenør:	uge 52-02 2020/2021
Anlægsperiode Rydning: Indbygning:	februar og marts 2021 april og maj 2021
Aflevering:	uge 24 2021 (medio juni)

6. INTERESSETER

Projektets interessenter er driftsorganisationen på sygehuset, sygehusets patienter og pårørende samt handicaporganisationer. Projektet har allerede i planlægningsfasen været genstand for offentligt interesse.

7. RISIKO

Da udførelsesfasen er placeret tidsmæssigt i vinterhalvåret kan der risikere at opstå udgifter til vejrlig samt eventuelle forsinkelser afledt heraf.

I jorden under forpladsen forefindes diverse føringsveje til forsyninger. Eventuelle forhold i forbindelse hermed, som ikke fremgår af kendt tegningsmateriale, kan udgøre en risiko såvel økonomisk som tidsmæssigt.

8. ØKONOMI

Samlet forventes projektet at andrage ca. 6,540 mio. kr. (2020-priser). Projekter har karakter af et anlægsprojekt.

Nedenstående ses det forventede budget:

Poster	Samlet pris
Byggeplads	280.000
Rydning mv.	710.000
Etablering af elevator	1.000.000
Anlægsarbejder i terræn	3.200.000
Gangsti langs facade	190.000
Ledelinjer	25.000
Byggetilladelse	50.000
Kabling/kloak i jord	300.000
UFO	300.000
Honorar	490.000
I alt	6.545.000

9. KONKLUSION

På baggrund af undersøgelserne vedr. behov, herunder funktion, økonomi, tid, lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i projektet. På denne baggrund indstilles

- at** projektet vedrørende justering af forpladsen på Kolding Sygehus igangsættes med udgangspunkt i den skitserede løsning
- at** anlægssummen på 6,545 mio. kr. (2020-priser)
